



CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1

Hiểu được các khái niệm tổng quan về dự án và Quản lý dự án

2

Hiểu được các nội dung về quản lý dự án đầu tư

3

Hiểu được mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư

4

Hiểu được chức năng và nhiệm vụ của cán bộ quản lý dự án

Giáo trình chính

[1]. Đinh Văn Hải, Trần Phương Anh (2019), *Giáo trình Quản lý dự án*, Nxb Tài chính.

Tài liệu khác

[2]. Từ Quang Phương (2005), *Giáo trình Quản lý dự án đầu tư*, Nxb Lao động – xã hội.

TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG



TÁI CẤU TRÚC
DOANH NGHIỆP



Đâu là dự án?



Chương 1:.1>Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.1 Dự án đầu tư

a. Khái niệm

Dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải được thực hiện với phương pháp riêng và theo một kế hoạch tiến độ nhằm tạo ra một thực thể mới.

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

Trên phương diện quản lý: Dự án là những nỗ lực có thời hạn nhằm tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.1 Dự án đầu tư

a. Khái niệm

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Nguồn: Luật đầu tư 2014, có hiệu lực 01/7/2015

Như vậy dự án nhằm mục đích đầu tư mới được gọi là dự án đầu tư, gồm 2 loại:

- Dự án đầu tư mới
- Dự án đầu tư mở rộng

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.1 Dự án đầu tư

a. Khái niệm

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

Một số khái niệm liên quan:

- Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật
- Đầu tư trực tiếp
- Đầu tư gián tiếp
- Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.1 Dự án đầu tư

b. Phân loại dự án đầu tư

- **Theo quy mô và tính chất (Luật đầu tư công 2014. PL trong Giáo trình, tr. 206):**

- + Dự án quan trọng quốc gia
- + Dự án nhóm A
- + Dự án nhóm B
- + Dự án nhóm C

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.1 Dự án đầu tư

b. Phân loại dự án đầu tư

- Theo quy nguồn vốn đầu tư, dự án đầu tư bao gồm:

- + Dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước
- + Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
- + Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước
- + Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn.

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.1 Dự án đầu tư

b. Phân loại dự án đầu tư

- Theo tái cơ cấu sản xuất, bao gồm:

+ Dự án đầu tư theo chiều rộng

+ Dự án theo chiều sâu

- Theo lĩnh vực hoạt động xã hội:

+ Dự án đầu tư phát triển

+ Dự án sản xuất kinh doanh

+ Dự án đầu tư phát triển KHKT

+ Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

- Theo thời gian thực hiện: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.1 Dự án đầu tư

c. Đặc trưng cơ bản của dự án đầu tư

Nghiên cứu đặc trưng của dự án đầu tư ở 2 giai đoạn đầu: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư.

- Có mục đích, kết quả và nguồn lực xác định
- Có chu kỳ phát triển riêng và có thời gian tồn tại hữu hạn
- Sản phẩm của dự án mang tính đơn chiếc, độc đáo (mới lạ)
- Dự án liên quan đến nhiều bên và có tương tác phức tạp giữa các bộ phận chức năng với quản lý dự án
- Tính bất định và độ rủi ro cao.

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.1 Dự án đầu tư

d. Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư theo dự án

- Đầu tư phát triển có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia
- Phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia phải thực hiện hàng loạt các hoạt động đầu tư phát triển trong các ngành, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế
- Dự án đầu tư là kim chỉ nam, là cơ sở vững chắc, là tiền đề cho việc thực hiện các công cuộc đầu tư đạt hiệu quả cao cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.2. Quản lý dự án đầu tư

a. Khái niệm

- *Trên phương diện kỹ thuật:*

Quản lý dự án đầu tư là việc ứng dụng các kiến thức, kỹ năng, các công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án đầu tư nhằm đạt được các mục tiêu đã định, đáp ứng yêu cầu và những mong đợi của khách hàng và những bên liên quan.

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.2. Quản lý dự án đầu tư

a. Khái niệm

- Trên phương diện nội dung của quá trình quản lý:

Quản lý dự án đầu tư là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án đầu tư nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi dự toán được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.2. Quản lý dự án đầu tư

a. Khái niệm

- *Nội dung của quá trình quản lý dự án đầu tư bao gồm:*

- Lập kế hoạch: Xây dựng mục tiêu, dự tính nguồn lực, xây dựng kế hoạch thực hiện
- Điều phối thực hiện dự án: Bố trí tiến độ thời gian, phân phối các nguồn lực, phối hợp các hoạt động,...
- Giám sát quá trình thực hiện dự án: Theo dõi kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện trạng, đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án

1.1.1. Khái niệm dự án và quản lý dự án

1.1.1.2. Quản lý dự án đầu tư

b. Tác dụng của quản lý dự án đầu tư

- Liên kết tất cả các hoạt động, các công việc của dự án
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thường xuyên, gắn bó giữa nhóm quản lý dự án với khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho dự án
- Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án
- Phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy sinh và điều chỉnh kịp thời trước
- Tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao hơn

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.2. Nội dung quản lý dự án đầu tư

1.2.1. Quản lý vĩ mô và quản lý vi mô đối với các dự án

- ✓ Quản lý vĩ mô đối với các dự án: Là quản lý Nhà nước đối với các dự án, bao gồm tổng thể các biện pháp vĩ mô tác động tới các yếu tố của quá trình hình thành, thực hiện và kết thúc dự án.
- ✓ Quản lý vi mô đối với các dự án: Là quản lý các hoạt động cụ thể của dự án như: Lập kế hoạch, điều phối, kiểm soát, ...các hoạt động của dự án bao gồm: Quản lý thời gian, chi phí, nguồn vốn đầu tư, rủi ro, quản trị hoạt động mua bán,.... Quá trình quản lý trong suốt các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư, vận hành và kết thúc.

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.2. Nội dung quản lý dự án đầu tư

1.2.2. Quản lý dự án đầu tư theo lĩnh vực hoạt động

Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu Quản trị Dự án quốc tế (PMI), quản lý dự án đầu tư bao gồm 9 lĩnh vực:

- Lập kế hoạch tổng quan;
- Quản lý phạm vi;
- Quản lý thời gian;
- Quản lý chi phí;
- Quản lý chất lượng;
- Quản lý nhân lực;
- Quản lý thông tin;
- Quản lý rủi ro;
- Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.2. Nội dung quản lý dự án đầu tư

1.2.3. Quản lý dự án theo chu kỳ dự án đầu tư

Tổng các giai đoạn quản lý dự án được gọi là chu kỳ của dự án:

❖ **Giai đoạn 1:** Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

- Xây dựng ý tưởng
- Thiết kế và lập kế hoạch

❖ **Giai đoạn 2:** Giai đoạn thực hiện đầu tư

❖ **Giai đoạn 3:** Giai đoạn vận hành và kết thúc dự án

- Sử dụng một phần công suất thiết kế
- Sử dụng hết công suất
- Công suất giảm dần và kết thúc khai thác dự án
- Thanh lý tài sản

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.2. Nội dung quản lý dự án đầu tư


1.2.4. Quản lý dự án và quản lý hoạt động thường xuyên

Quản lý dự án	Quản lý hoạt động thường xuyên
Nhiệm vụ không có tính lặp lại	Nhiệm vụ có tính lặp lại
Tỷ lệ sử dụng nguồn lực cao	Tỷ lệ sử dụng nguồn lực thấp
Tập trung vào một loại hay một số lượng nhất định hàng hóa hoặc dịch vụ	Sản xuất một khối lượng lớn hàng hóa hoặc dịch vụ trong một thời kỳ
Thời gian tồn tại có giới hạn	Thời gian tồn tại của doanh nghiệp và công ty lâu dài
Các số liệu thống kê ít, nên không được sử dụng nhiều trong các quyết định về dự án	Các số liệu thống kê sẵn và hữu ích đối với việc ra quyết định
Phải trả giá đắt cho các quyết định sai lầm	Không quá tốn kém khi choộc lại lỗi lầm
Nhân sự mới cho dự án	Tổ chức theo nhóm là hình thức phổ biến
Phân chi trách nhiệm thay đổi tùy thuộc vào tính chất của từng dự án	Trách nhiệm rõ ràng và được điều chỉnh qua thời gian
Môi trường làm việc thường xuyên thay đổi	Môi trường làm việc thường ổn định

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.3. Mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư

1.3.1. Mô hình quản lý dự án theo chức năng

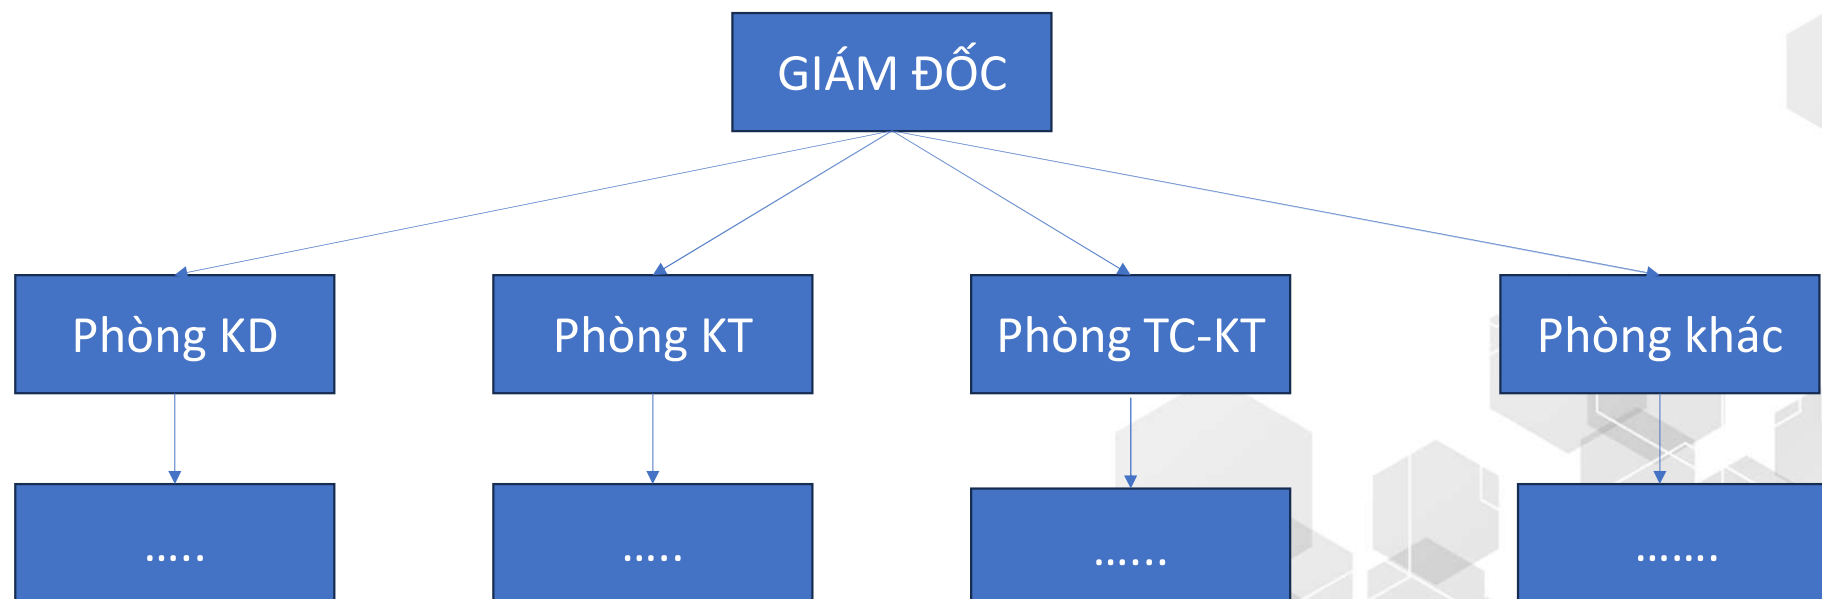


Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.3. Mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư

1.3.2. Mô hình chuyên trách quản lý dự án

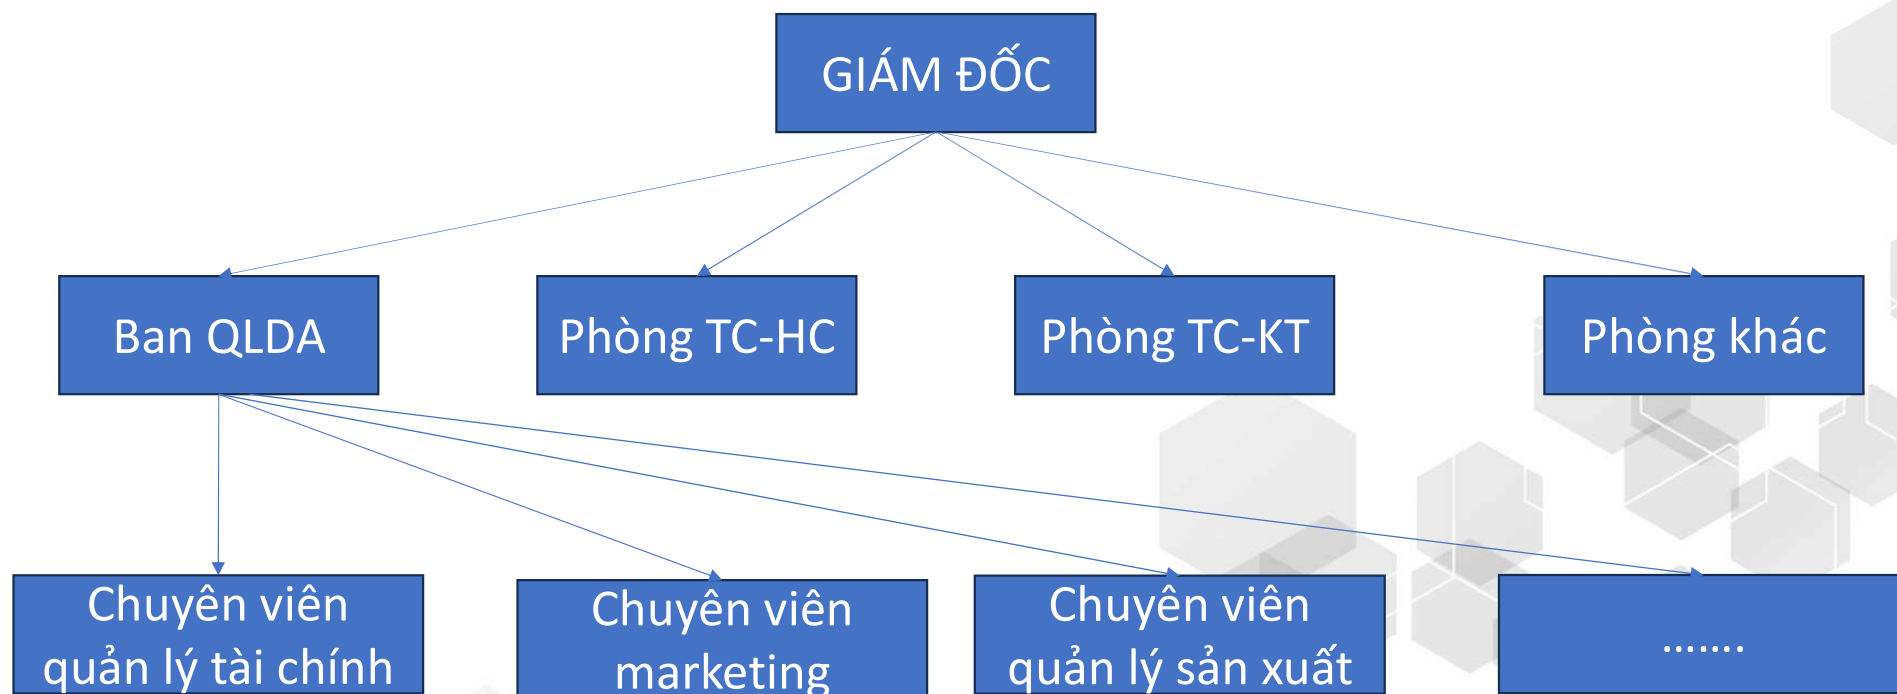


Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.3. Mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư

1.3.2. Mô hình quản lý dự án dạng ma trận

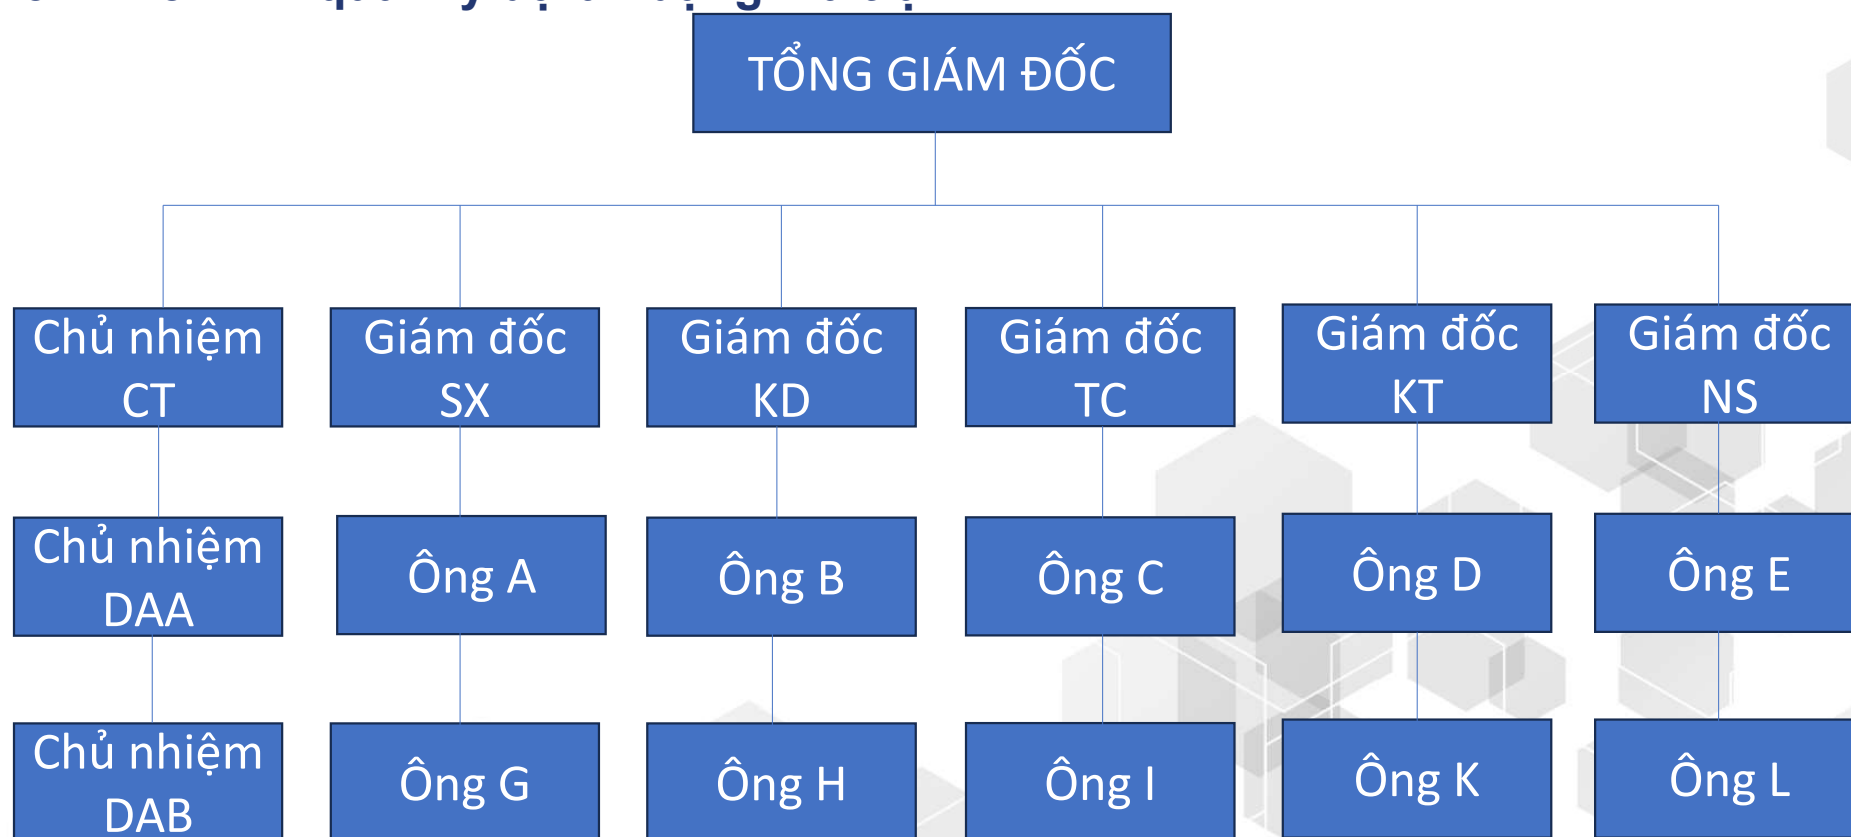

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.4. Cán bộ quản lý dự án

1.4.1. Chức năng của cán bộ quản lý dự án

❖ **Lập kế hoạch dự án:** Mục đích

- Đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của dự án
- Chi ra phương pháp phù hợp để đạt mục tiêu một cách nhanh nhất xác định các công việc cần làm, công cụ thực hiện trong phạm vi giới hạn về nguồn lực.

❖ **Tổ chức thực hiện dự án:**

- Cán bộ QLDA có quyền quyết định phương pháp thực hiện công việc dự án
- Tổ chức thực hiện dự án, phối hợp có hiệu quả giữa các bên tham gia, phân định rõ trách nhiệm của những người tham gia dự án
- Báo cáo tiến trình thực hiện dự án cho cấp trên, thông tin cho nhóm thực hiện dự án....

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.4. Cán bộ quản lý dự án

1.4.1. Chức năng của cán bộ quản lý dự án

❖ Chỉ đạo hướng dẫn:

Sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ QLDA chỉ đạo và hướng dẫn, ủy quyền, khuyến khích động viên, phối hợp với mọi thành viên trong nhóm thực hiện tốt dự án

❖ Kiểm tra giám sát:

Cán bộ QLDA có chức năng kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của dự án: Chất lượng, kỹ thuật, ngân sách, tiến độ thời gian,...

❖ Chức năng thích ứng:

Trong quá trình QLDA, nhà quản lý thường xuyên phải đối đầu với những thay đổi, do vậy những kế hoạch, các hành động, chuẩn mực thực hiện cũng phải thay đổi theo.

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.4. Cán bộ quản lý dự án

1.4.2. Trách nhiệm của chủ nhiệm dự án

❖ Đối với cấp trên:

- Bảo tồn mọi nguồn lực và quản lý hiệu quả
- Báo cáo đầy đủ, trung thực những thông tin về thực trạng dự án: Chi phí, tiến độ và triển vọng của dự án

❖ Đối với dự án:

- Điều hành, QLDA nhằm hoàn thành các mục tiêu của dự án và đảm bảo các yêu cầu về: Chất lượng, chi phí, thời gian và nguồn lực được phê duyệt.
- Lãnh đạo nhóm quản lý dự án, phối hợp nỗ lực của mọi thành viên nhằm thực hiện thành công mục tiêu của dự án.
- Có trách nhiệm với khách hàng, quản lý những thay đổi, những vấn đề phát sinh và biện pháp giải quyết

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.4. Cán bộ quản lý dự án

1.4.2. Trách nhiệm của chủ nhiệm dự án

❖ Đối với thành viên dự án:

- Quan tâm đến mọi thành viên trong nhóm, đặc biệt là chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của dự án
- Có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện cho mọi người tìm công việc mới hoặc trở về đơn vị cũ theo nguyện vọng cùng như yêu cầu công việc

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

1.4. Cán bộ quản lý dự án

1.4.3. Các kỹ năng cần có của chủ nhiệm dự án

- Kỹ năng lãnh đạo: Có tầm nhìn, có đủ quyền lực, uy tín và nêu gương tốt
- Kỹ năng giao tiếp: Lắng nghe, thuyết phục
- Kỹ năng tổ chức: Lập kế hoạch, xác định mục tiêu, phân tích
- Kỹ năng thương lượng và giải quyết khó khăn, vướng mắc
- Kỹ năng tiếp thị và quan hệ khách hàng
- Kỹ năng ra quyết định

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Câu 1: Khái niệm, phân loại, đặc trưng cơ bản của dự án đầu tư?

Câu 2: Tác dụng của QLDA? Vì sao phải quản lý dự án trên cả 2 phương diện: Quản lý vĩ mô và quản lý vi mô?

Câu 3: Sự giống và khác nhau giữa QLDA và quản lý hoạt động thường xuyên?

Câu 4: Phân biệt các mô hình QLDA cơ bản?

Câu 5: Cán bộ QLDA cần phải có những chức năng gì? Chức năng nào quan trọng nhất, vì sao?
