



CHƯƠNG 3

LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1

Hiểu những nội dung cơ bản và quy trình, phương pháp lập kế hoạch dự án

2

Vận dụng được các phương pháp lập kế hoạch dự án.

Giáo trình chính

[1]. Đinh Văn Hải, Trần Phương Anh (2019), *Giáo trình Quản lý dự án*, Nxb Tài chính.

Tài liệu khác

[2]. Từ Quang Phương (2005), *Giáo trình Quản lý dự án đầu tư*, Nxb Lao động – xã hội.

Công ty ABC đang chuẩn bị triển khai một dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ven biển với tổng mức đầu tư dự kiến là 200 tỷ đồng và thời gian thực hiện là 24 tháng. Dự án này đòi hỏi phải hoàn thành trước mùa du lịch cao điểm để đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình lập kế hoạch, Ban quản lý dự án nhận thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ như thời tiết khắc nghiệt, sự chậm trễ trong việc cung ứng vật liệu và nguy cơ xung đột với các dự án phát triển lân cận. Bên cạnh đó, việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường cũng là một thách thức lớn do vị trí địa lý đặc thù của dự án. Ban quản lý dự án cần phải lập một kế hoạch chi tiết để đảm bảo tiến độ, ngân sách và chất lượng của dự án.

Câu hỏi: Xác định các bước chính mà Ban quản lý dự án cần thực hiện để lập kế hoạch cho dự án này?

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.1. Khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án

3.1.1. Khái niệm

Lập kế hoạch dự án là việc tổ chức dự án theo một Quy trình logic, xác định mục tiêu của dự án và cụ thể hóa thành các công việc cần làm, các biện pháp, các nguồn lực và thời gian cần thiết nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu của dự án.

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.1. Khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án

3.1.1. Khái niệm

Như vậy, lập kế hoạch dự án bao gồm:

- Xác định trình tự logic công việc;
- Xác định mục tiêu và cụ thể hóa các công việc cần làm;
- Xác định cách thức, phương pháp thực hiện từng công việc;
- Xác định nguồn lực và thời gian cần thiết cho từng công việc.

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.1. Khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án

3.1.2. Các loại kế hoạch dự án

- ❖ **Kế hoạch tổng thể:** Giới thiệu tổng quan về dự án, mục tiêu, nhân sự, kinh phí, nguồn lực, tiến độ và thời gian thực hiện.
- ❖ **Kế hoạch phạm vi:** Phân tách công việc: chỉ rõ cv nào thuộc DA, công việc nào không thuộc DA
- ❖ **Kế hoạch thời gian:** Xác định thời gian bắt đầu, kết thúc, độ dài thời gian thực hiện toàn bộ dự án, từng công việc, mối quan hệ giữa các công việc
- ❖ **Kế hoạch chi phí:** dự tính tổng vốn đầu tư, chi phí cho các công việc, khoản mục, thời đoạn, hạng mục công việc

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.1. Khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án

3.1.2. Các loại kế hoạch dự án

- ❖ **Kế hoạch nhân lực:** xác định số lượng lao động cần thiết cho dự án, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, tiền công.
- ❖ **Kế hoạch phân phối nguồn lực:** xác định tổng nhu cầu các nguồn lực dành cho dự án, phân chia cho từng công việc, hạng mục đầu tư theo tiến độ
- ❖ **Kế hoạch quản lý chất lượng:** chỉ rõ tiêu chuẩn chất lượng cần đạt được đối với từng phần việc, công tác đảm bảo chất lượng và các phương pháp
- ❖ **Kế hoạch quản lý rủi ro:** xác định các loại rủi ro tiềm tàng, xác định cá nhân hoặc bộ phận chịu trách nhiệm, dự tính phương pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro.

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.1. Khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án

3.1.3. Tác dụng của lập kế hoạch dự án

- ✓ Kế hoạch nhân lực và kế hoạch khác có liên quan là cơ sở tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân lực cho dự án
- ✓ Kế hoạch chi phí là căn cứ cơ bản để dự toán tổng vốn đầu tư cho dự án và chi phí cho từng công việc
- ✓ Kế hoạch phân phối nguồn lực và kế hoạch thời gian là cơ sở quan trọng để điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ các công việc của dự án
- ✓ Lập kế hoạch dự án chính xác làm giảm thiểu rủi ro của dự án, lãng phí nguồn lực
- ✓ Là căn cứ để kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến trình thực hiện dự án trên các mặt
- ✓ Lập kế hoạch tốt, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu của dự án

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.1. Yêu cầu cơ bản đối với công tác lập kế hoạch dự án

- ✓ Kế hoạch phải toàn diện, đầy đủ các loại kế hoạch cần thiết cho quản lý và thực hiện dự án
- ✓ Kế hoạch đầy đủ nội dung, rõ ràng, tuân thủ đúng yêu cầu của Nhà nước và sự thống nhất giữa các bên liên quan
- ✓ Quy trình đảm bảo tính khoa học
- ✓ Kế hoạch nên có sự tham gia thực sự của các chủ thể liên quan
- ✓ Kế hoạch được lập phải dựa trên những thông tin đầy đủ, có độ chính xác cao...
- ✓ Kế hoạch phải mang tính khả thi, giảm thiểu được các rủi ro có thể xảy ra.

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.2. Nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án

Nội dung 1: Tổng quan chung về dự án

- + Lý do ra đời dự án
- + Mục tiêu tổng quát cần đạt được của dự án (trong mối quan hệ với mục tiêu chung của DN)
- + Phạm vi dự án
- + Cơ cấu tổ chức quản lý dự án
- + Những mốc thời gian quan trọng trong quá trình thực hiện dự án+ Nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án, nguồn tài trợ...

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.2. Nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án

Nội dung 2: Các mục tiêu của dự án

- + Gồm các thông tin chi tiết cho mục đích chung đã nêu ra ở phần tổng quan.
- + Phần này cần có các thông tin về lợi nhuận, năng lực cạnh tranh, thị phần của DN dự kiến tăng thêm nếu thực hiện dự án, mục tiêu kinh tế - xã hội khác.

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.2. Nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án

Nội dung 3: Khía cạnh kỹ thuật và quản trị của dự án

+ **Về kỹ thuật cần phải:**

- . Đánh giá, so sánh kỹ thuật của dự án với khả năng kỹ thuật hiện có
- . Đánh giá tính khả thi trong quá trình thực hiện dự án về trình độ, quy mô, năng lực, kỹ thuật...
- . Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khi vận hành
- . Xác định phương án xử lý môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

+ **Về quản lý dự án cần phải:**

- . Xác định hình thức tổ chức quản lý dự án
- . Những điểm khác biệt cần chú ý trong quản lý dự án
- . Những đặc thù của dự án có liên quan đến các đối tác

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.2. Nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án

Nội dung 4: Vấn đề hợp đồng của dự án

Mô tả và liệt kê tất cả các hợp đồng liên quan đến dự án, như:

- + Hợp đồng đền bù, giải phóng mặt bằng, HĐ thuê đất (nếu có)
- + Hợp đồng thầu chính, thầu phụ
- + Hợp đồng cung cấp chính về máy móc thiết bị, nguyên vật liệu
- + Hợp đồng tư vấn
- + Hợp đồng phân phối sản phẩm..

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.2. Nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án

Nội dung 5: Thời gian và tiến độ dự án

- + Xác định rõ lịch trình thực hiện các công việc của dự án
- + Xác định các công việc quan trọng, then chốt có ý nghĩa quyết định đến tiến độ dự án
- + Xác định thời gian bắt đầu, kết thúc và thời gian cần thiết cho từng công việc
- + Xác định các mốc thời gian quan trọng trong thực hiện dự án
- + So sánh, đánh giá sự phù hợp giữa tiến độ thời gian với chi phí, nguồn lực phân phối cho từng công việc.
- + Kiểm tra, đánh giá, phê duyệt chính thức tiến độ chung của dự án

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.2. Nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án

Nội dung 6: Nguồn lực dự án

Trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật, các quy định của Nhà nước, đặc điểm của dự án.... Để lập kế hoạch phân phối nguồn lực hợp lý, trong kế hoạch này cần phải:

- + Xác định các loại nguồn lực, tổng nhu cầu từng loại nguồn lực cần thiết cho dự án.
- + Xác định thứ tự ưu tiên phân phối nguồn lực của dự án cho từng công việc, từ đó xây dựng sơ bộ phương án phân phối nguồn lực.
- + Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu, tìm kiếm các khả năng giải quyết thiếu hụt nguồn lực.

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.2. Nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án

Nội dung 7: Ngân sách và dự toán kinh phí cho dự án

Ngân sách của dự án bao gồm cả hoạt động thu và chi, kế hoạch này cần phải:

- + Xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án
- + Kế hoạch huy động vốn cho dự án trong từng thời kỳ
- + Kế hoạch phân bổ ngân sách trong từng thời kỳ cho các đơn vị thi công, cho các hạng mục công việc, cho các khoản mục chi phí...
- + Xác định nguyên tắc quản lý các chi phí của dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.2. Nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án

Nội dung 8: Nhân sự dự án

- + Xác định toàn bộ nhu cầu nhân lực cho dự án, trong đó chia ra từng loại lao động, trong từng giai đoạn thực hiện dự án.
- + Liệt kê những yêu cầu nhân sự cần thiết đối với dự án.
- + Nêu rõ các kỹ năng đặc biệt, loại hình đào tạo cần thiết, vấn đề tuyển dụng, các hạn chế về pháp lý hay chính sách đối với lực lượng lao động và bất cứ yêu cầu đặc biệt nào.
- + Kế hoạch lao động, tiền lương theo từng giai đoạn của dự án.

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.2. Nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án

Nội dung 9: Phương pháp kiểm tra và đánh giá dự án

- + Mỗi dự án sẽ được đánh giá theo những tiêu chuẩn và phương pháp khác nhau, được xác định ngay từ ban đầu.
- + Phần này mô tả tóm tắt những thủ tục cần phải tuân thủ trong việc điều hành, thu thập, lưu trữ và đánh giá quá trình dự án

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.2. Nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án

Nội dung 10: Các vấn đề rủi ro tiềm ẩn

Vấn đề rủi ro và kế hoạch đối phó với rủi ro cần được xem xét từ đầu để khi rủi ro xảy ra có các phản ứng kịp thời nhằm làm giảm các hậu quả gây bất lợi đến mục tiêu dự án:

- + Thất bại về kỹ thuật
- + Phương án tổ chức thực hiện không phù hợp
- + Ảnh hưởng của thời tiết
- + Hạn chế về nguồn lực
- + Vi phạm hợp đồng của các nhà thầu...

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.3. Quy trình lập kế hoạch dự án



Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.3. Quy trình lập kế hoạch dự án

Bước 1: Xác lập mục tiêu dự án

- + Cần hiểu rõ về đối tượng DA hướng tới: khách hàng, người dùng SP, lãnh đạo..
- + Mục tiêu phản ánh thời điểm bắt đầu và hoàn thành dự án, chi phí dự toán và các kết quả cần đạt được (đảm bảo nguyên tắc SMART)

Bước 2: Phát triển kế hoạch

- + Xác định các nhiệm vụ chính để thực hiện mục tiêu
- + Phát triển kế hoạch được thực hiện thông qua việc lập danh mục và mã hóa công việc, xây dựng sơ đồ cơ cấu phân chia công việc (WBS - Work Breakdown Structure) – Chi tiết ở phần sau



Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.3. Quy trình lập kế hoạch dự án

Bước 3: Xây dựng sơ đồ kế hoạch dự án

- + Sau khi xác định được mối quan hệ giữa các công việc, cần phải lập một sơ đồ kế hoạch nhằm phản ánh quan hệ logic của các công việc
- + 2 phương pháp chủ yếu: PP lập sơ đồ theo thứ tự công việc (AON) và PP lập sơ đồ theo mũi tên (AOA)

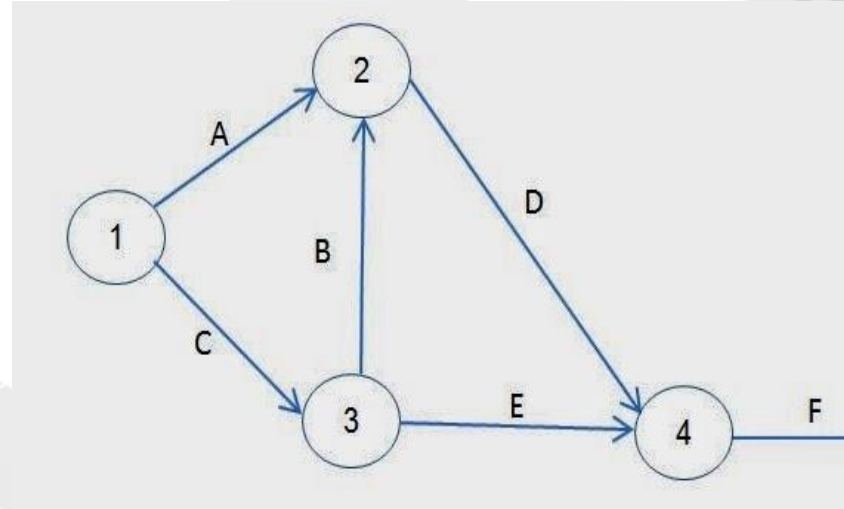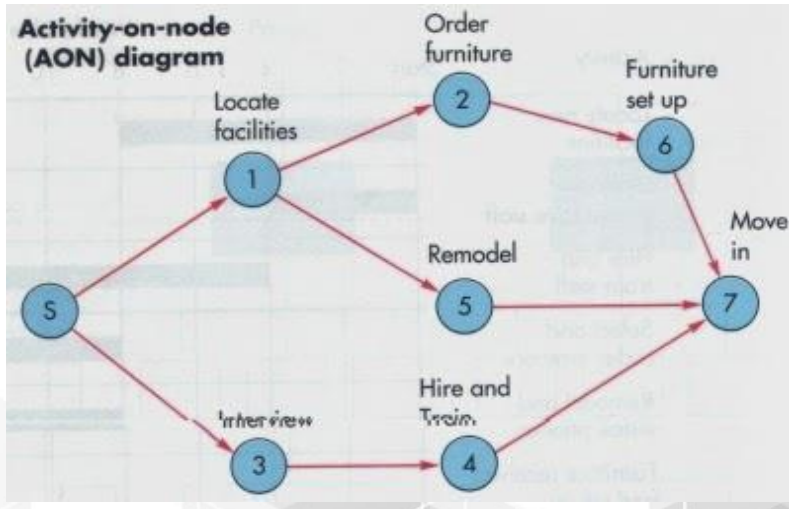

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.3. Quy trình lập kế hoạch dự án

Bước 4: Lập tiến độ thực hiện dự án

- + Dự kiến thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi hoạt động
 - + Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi hoạt động. Kiểm tra liệu các nguồn lực có đủ để kết thúc công việc như đã lập kế hoạch không? Xác định các mốc quan trọng cho dự án.
 - + Xác định Quy trình cần thiết của các hoạt động
 - + Xác định các hoạt động quan trọng và dự kiến các rủi ro
 - + Xác định sự cân đối giữa thời gian và chi phí
- => Công cụ: Biểu đồ thanh ngang (Sơ đồ GANTT), CPM, PERT

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.3. Quy trình lập kế hoạch dự án

Bước 5: Dự toán chi phí và phân bổ nguồn lực

- + Dự kiến nguồn lực cần thiết cho mọi hoạt động và lồng ghép vào ngân sách DA
 - + Lập hệ thống kiểm soát tài chính (nguyên tắc, trách nhiệm...) dựa vào quy định của nhà nước/ công ty/ nhà tài trợ.
 - + Lập kế hoạch tài chính (ở đâu, khi nào, bao nhiêu, và cho việc gì?)
 - + Chuẩn bị dự toán về dòng tiền kể cả những chi tiêu bất ngờ
- => Công cụ: Phân tích dòng tiền, phân tích rủi ro

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.3. Quy trình lập kế hoạch dự án

Bước 6: Lập kế hoạch kiểm soát và báo cáo

- + Xác định các cách đo tiến độ theo giai đoạn
 - + Xác định cơ chế kiểm soát: ai, khi nào và làm thế nào để kiểm soát tiến độ thực hiện
 - + Xác định các tiêu chuẩn chất lượng
 - + Thực hiện việc quản lý rủi ro: xác định, phân tích các rủi ro liên quan và phác thảo đối sách các rủi ro.
- => Đây là phần hay bị thiếu trong kế hoạch dự án, do đó sẽ gây nhiều “cơn đau đầu” cho các GD dự án ở giai đoạn thực hiện sau này.

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.4. Các phương pháp lập kế hoạch dự án

Lập kế hoạch dự án theo mốc thời gian

Xác định các mốc thời gian bắt đầu và kết thúc của dự án, các giai đoạn hoặc các hoạt động chính của dự án.

Thời gian	Năm 1	Năm 2	
Công việc	1,2,3.....10,11,12	1,2,3.....10,11,12	1,2,3.....10,11,12
A	↑		↑
B	↑		
C		↑	↑
D		↑	
E		↑	↑

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.4. Các phương pháp lập kế hoạch dự án

Lập kế hoạch dự án theo sơ đồ mạng

Biểu diễn toàn bộ khối lượng công việc của dự án, thể hiện Quy trình logic, thứ tự trước sau giữa các công việc, thời gian thực hiện công việc:

- + Phương pháp đường găng (CPM)
 - + Phương pháp tổng quan và đánh giá dự án (PERT)
- ⇒ PP này sẽ được trình bày chi tiết trong chương 4


Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.4. Các phương pháp lập kế hoạch dự án

Lập kế hoạch dự án theo sơ đồ GANTT (Sơ đồ thanh ngang)

Biểu diễn các công việc và thời gian thực hiện công việc bằng thanh ngang theo Quy trình thời gian (chi tiết trong Chương 4)

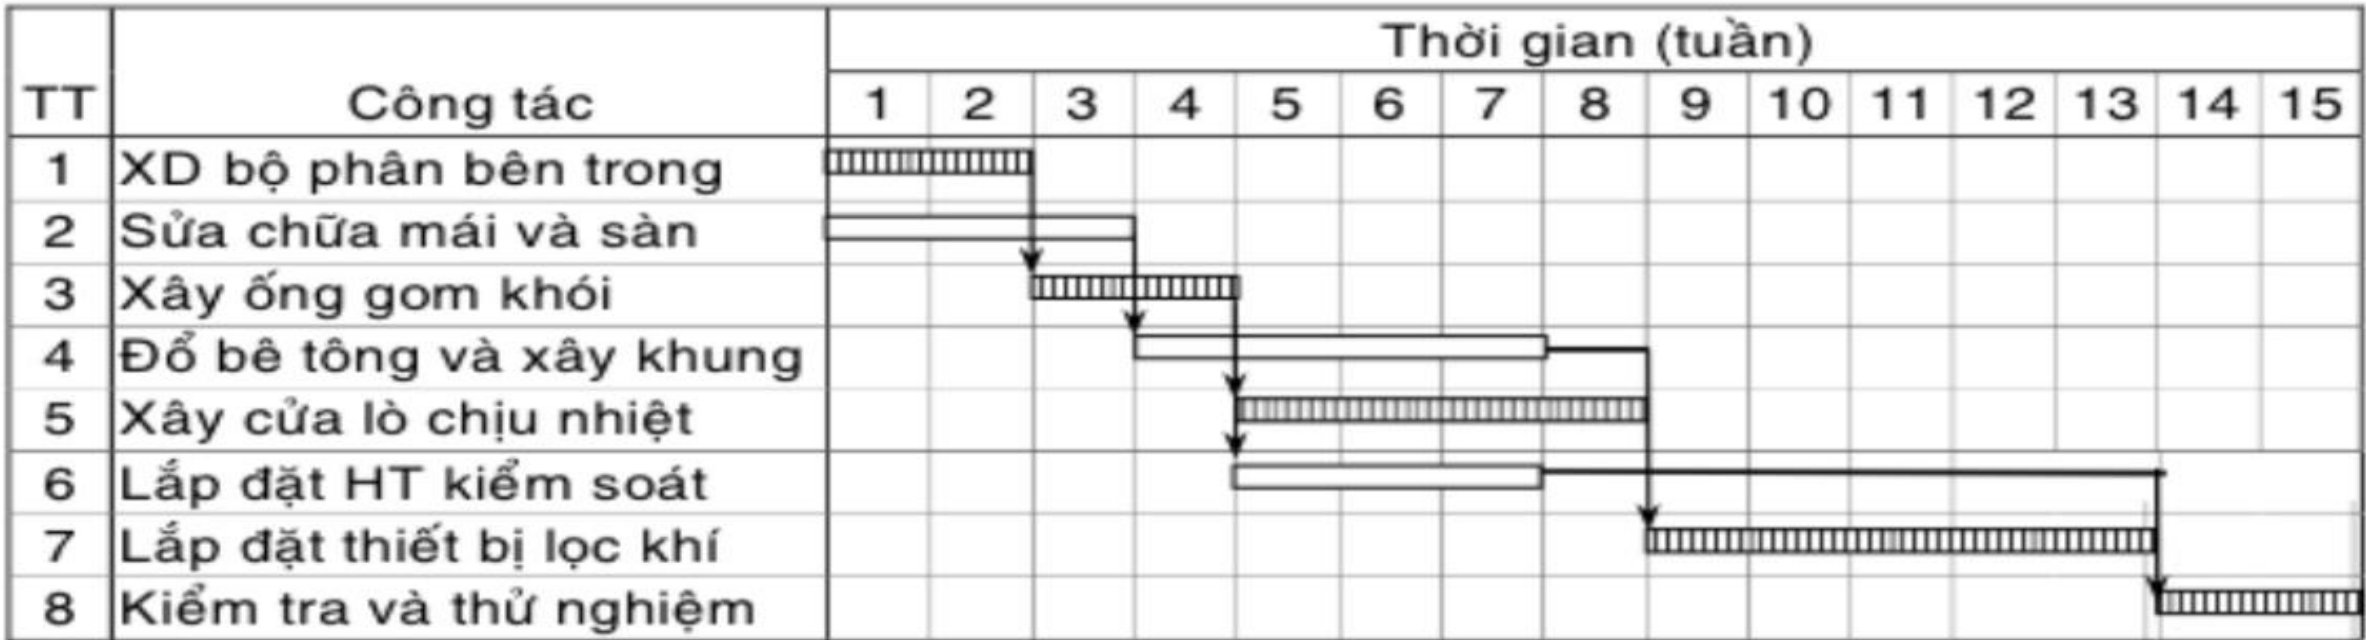

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.2. Nội dung và quy trình lập kế hoạch dự án

3.2.4. Các phương pháp lập kế hoạch dự án

Lập kế hoạch dự án theo cấu trúc phân tách công việc (WBS)

- Phân chia dự án thành các nhóm nhiệm vụ, các nhiệm vụ bộ phận, các nhóm công việc và công việc cụ thể.
- Xác định, liệt kê, lập bảng giải thích cho từng công việc của dự án

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.3. Lập kế hoạch dự án theo cấu trúc phân tách công việc (Work breakdown structure – WBS)

3.3.1. Khái niệm và phương pháp phân tách công việc

3.3.1.1. Khái niệm

Phân tách công việc là việc phân chia có hệ thống theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể, xác định, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án.


Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.3. Lập kế hoạch dự án theo cấu trúc phân tách công việc (WBS)

3.3.1. Khái niệm và phương pháp phân tách công việc

3.3.1.1. Khái niệm

Sơ đồ cơ cấu phân tách công việc (WBS)

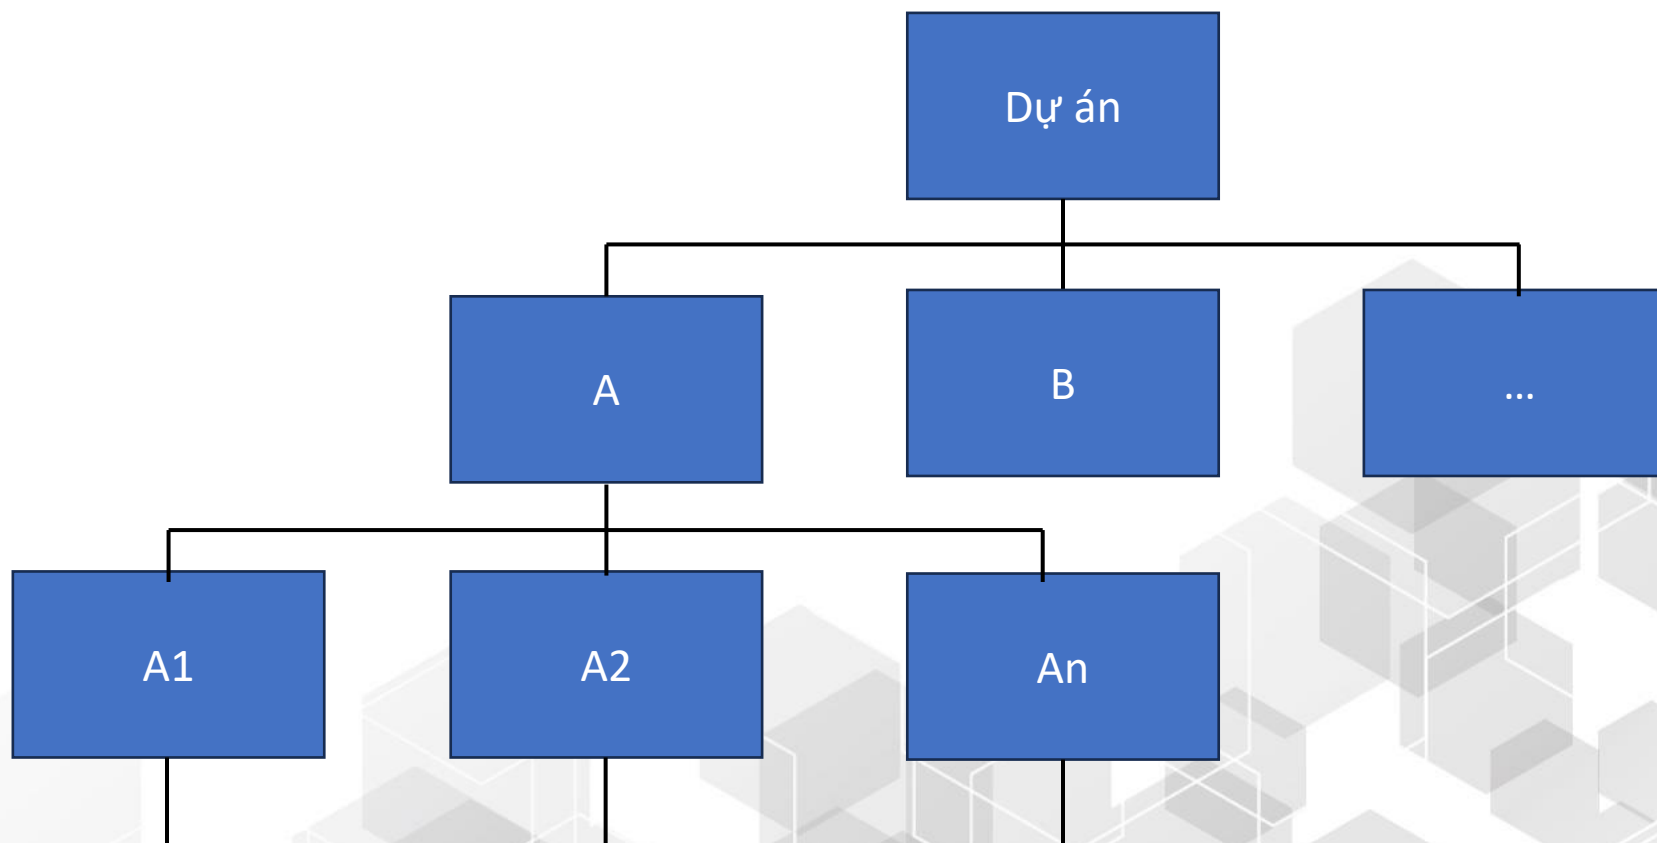

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.3. Lập kế hoạch dự án theo cấu trúc phân tách công việc (WBS)

3.3.1. Khái niệm và phương pháp phân tách công việc

3.3.1.2. Phương pháp phân tách công việc

Bảng 3.3. Phân tách công việc dự án xây dựng văn phòng X

TT	WBS	Tên nhiệm vụ	Công việc trước	Kế hoạch	Thực tế	Ghi chú
1	1	Chuẩn bị mặt bằng				
2	2	Xây nhà				
3	2.1	Đổ móng				
4	2.2	Xây tường và trần tầng 1				
5	2.3	Xây tường và trần tầng 2				
6	2.4	Làm xây thượng và tum				
7	3	Nội thất				
8	3.1	Điện				
9	3.2	Nước				
10	4	Hoàn thiện				


Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.3. Lập kế hoạch dự án theo cấu trúc phân tách công việc (WBS)

3.3.1. Khái niệm và phương pháp phân tách công việc

3.3.1.2. Phương pháp phân tách công việc

Sơ đồ phân tách công việc dự án xây dựng văn phòng X

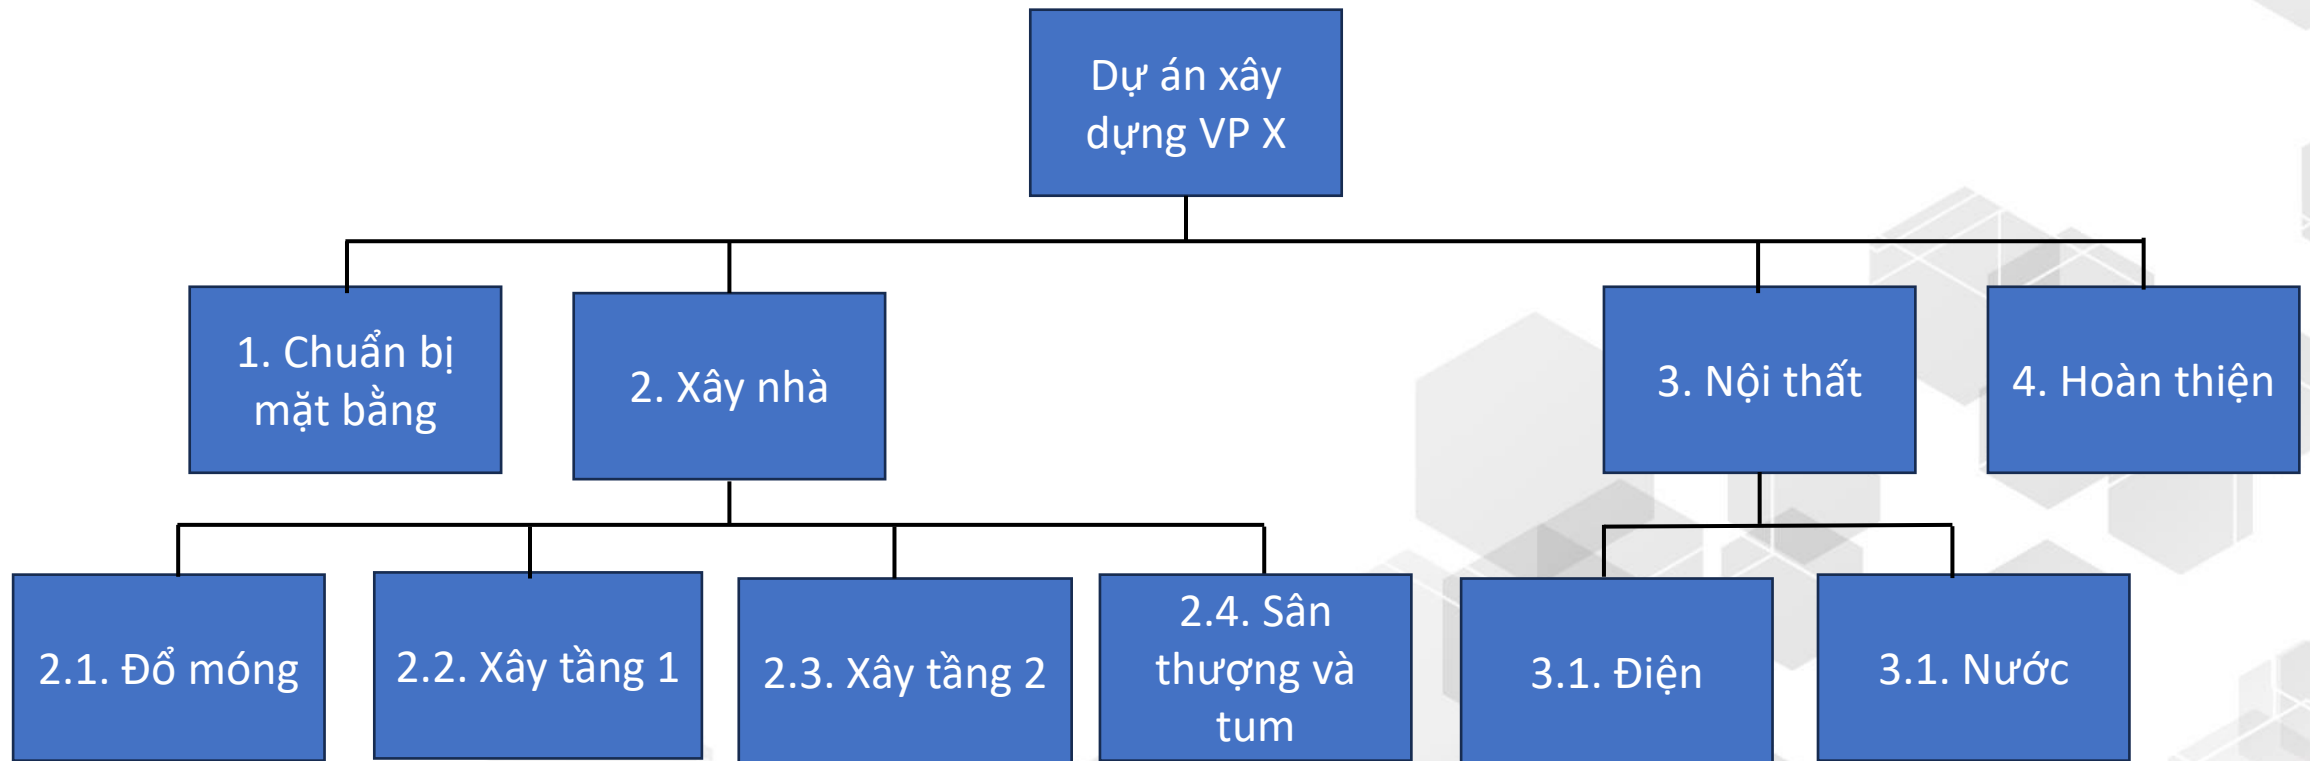

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.3. Lập kế hoạch dự án theo cấu trúc phân tách công việc (WBS)

3.3.2. Tác dụng của phân tách công việc

- Xác định được phạm vi của dự án, tách dự án thành các công việc với mức độ chi tiết, cụ thể hơn.
- Làm cơ sở phát triển trình tự và thứ tự quan hệ trước sau giữa các công việc, là cơ sở để lập sơ đồ mạng PERT/CPM
- Là cơ sở xây dựng các kế hoạch chi tiết và điều chỉnh các kế hoạch tiến độ thời gian, phân bổ các nguồn lực cho từng công việc
- Là cơ sở để đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện công việc của dự án trong từng thời kỳ
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, hạn chế được những sai sót trong quá trình điều phối kế hoạch, tiến độ, nguồn lực và chi phí

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.3. Lập kế hoạch dự án theo cấu trúc phân tách công việc (WBS)

3.3.3. Lập những chú giải cần thiết

Bảng 3.4. Xác định trách nhiệm của cán bộ các cấp trong quản lý dự án

Nhà quản lý	Cấp trên	Giám đốc	Giám đốc dự án	Trưởng phòng Thiết kế	Trưởng phòng Kinh doanh	Trưởng phòng Sản xuất
Nhiệm vụ (Công việc)						
Lập kế hoạch dự án	5	2	1	3	3	3
Phân tách công việc		4	1	3	3	3
Dự toán chi phí						
Lập kế hoạch thị trường						
Xây dựng tiến độ dự án						

Ghi chú: 1. Trách nhiệm trực tiếp; 2. Giám sát chung; 3. Phải được tham khảo ý kiến; 4. Chỉ đạo và phê duyệt; 5. Phê duyệt cuối cùng

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

3.3. Lập kế hoạch dự án theo cấu trúc phân tách công việc (WBS)

3.3.4. Các nguyên tắc cơ bản thực hiện phân tách công việc

- Mỗi công việc chỉ xuất hiện một lần trong WBS
- Nội dung mỗi công việc trên bằng tổng nội dung các công việc bậc dưới
- Mỗi công việc (hay hoạt động) phải có một người (hay bộ phận) phụ trách, chịu trách nhiệm
- WBS phải nhất quán với logic công việc
- Các thành viên nhóm dự án phải được tham gia vào quá trình phân tách công việc thuộc dự án
- WBS phải là công cụ linh hoạt, dễ thể hiện những thay đổi diễn ra trong quá trình thực hiện dự án
